




Actualisatie IHP PO en Binnensport Gemeente Maastricht

Stadsronde 19 november 2024



Gemeente Maastricht

Actualisatie IHP
Primair en Speciaal
Onderwijs en
Binnensport-
accommodaties
2025-2028

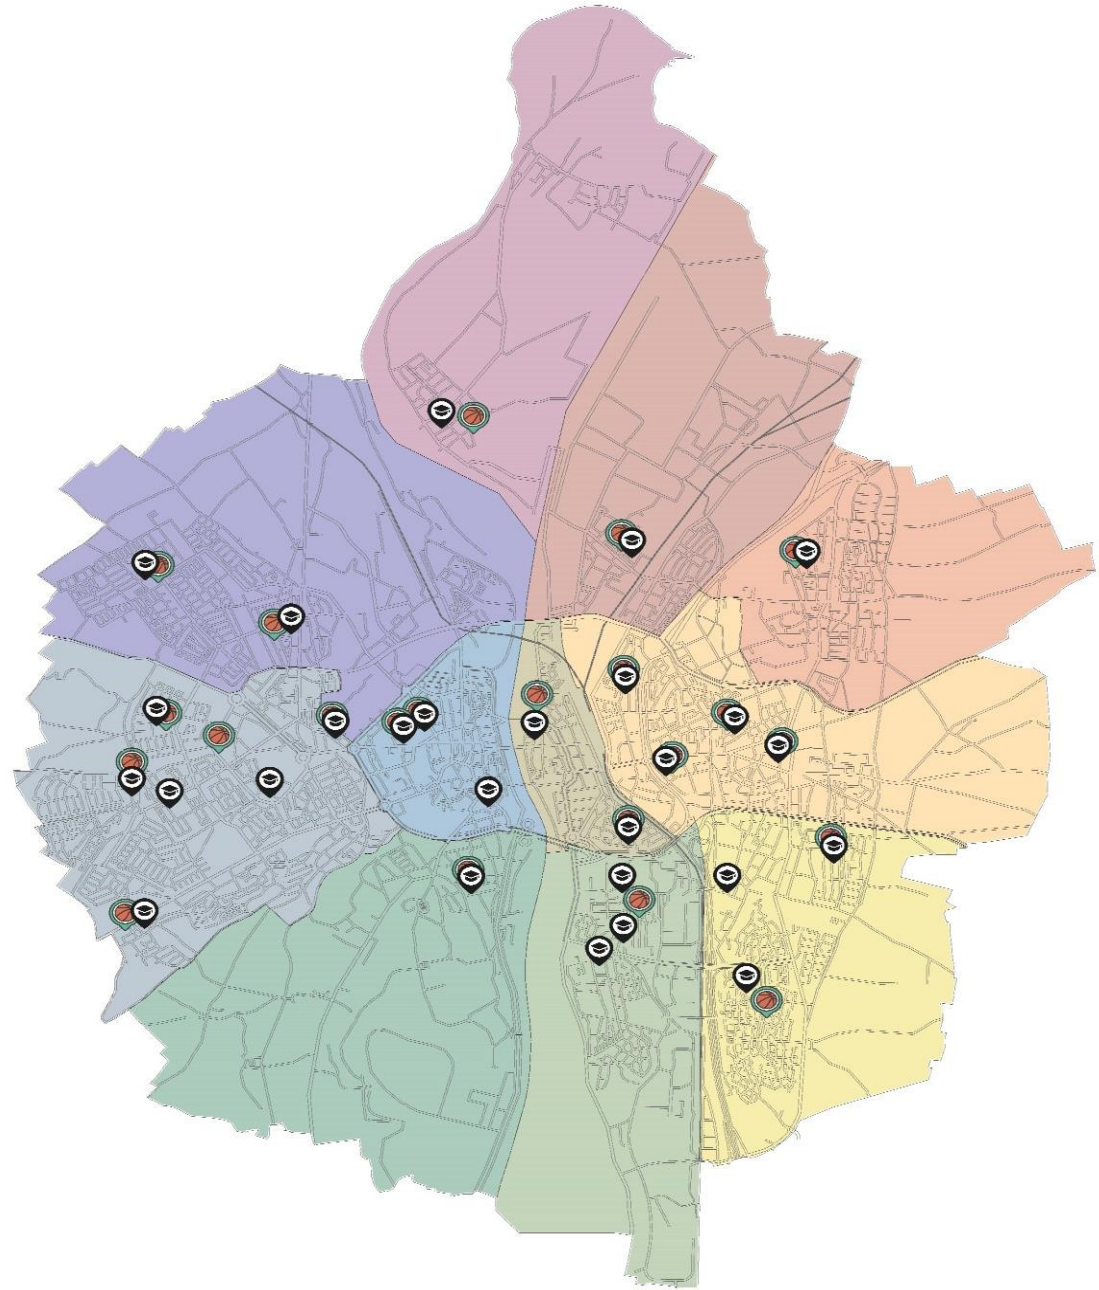

Reikwijdte actualisatie IHP Primair en Speciaal Onderwijs

- ✓ Basis is het vastgestelde IHP van 2019
- ✓ Nieuwe feiten, inzichten en wensen
- ✓ Nadrukkelijke koppeling met bewegingsonderwijs (integraal besluit binnensportaccomodaties)
- ✓ Opgave verduurzaming



Realisatie eerste
periode IHP
2020-2024
Onderwijshuisvesting



Stand van zaken realisatie eerste periode IHP 2020-2024

Naam school	Voorziening huidig IHP	Uitvoeringsjaar	Stand van zaken
IKC Bernard Lievegoed	Capaciteitsuitbreiding	2020	Gerealiseerd
Campus Special Needs	Tijdelijke huisvesting	2020	Gerealiseerd
KKC West	Nieuwbouw	2021	Lopend
IKC Scharn	Nieuwbouw	2022	Lopend
IKC Dynamiek	Renovatie	2022	Afwachting actualisatie
OBS De Binnenstad	Capaciteitsuitbreiding	2022	Lopend
IKC Wolder	Renovatie / Capaciteitsuitbreiding	2023	Afwachting actualisatie
IKC De Vlinderboom	Renovatie / Capaciteitsuitbreiding	2024	Afwachting actualisatie
IKC Wyck	Nader onderzoek aanpassing huisvesting	2024	Gerealiseerd



Uitvoeringsagenda
Tweede termijn IHP
2025 tot en met 2028
Onderwijshuisvesting



Overzicht voorzieningen tweede periode IHP 2025 tot en met 2028 Onderwijshuisvesting

School	Voorziening huidig IHP	Voorziening actualisatie	Start voorbereiding
Dynamiek	Renovatie	Nieuwbouw	2025
Vlinderboom	Renovatie / capaciteitsuitbreiding	Nieuwbouw	2026
Bernard Lievegoed	niet opgenomen	Levensduur verlengende renovatie	2026
Wyck	Haalbaarheidsonderzoek	Vervolg haalbaarheidsonderzoek	2024/2025
Sint Pieter	Niet opgenomen	Uitbreiding permanent	2025
Petrus en Paulus (Wolder)	Renovatie / capaciteitsuitbreiding	Vernieuwbouw / capaciteitsuitbreiding	2025
Amby	Renovatie / capaciteitsuitbreiding	Gedeeltelijke renovatie / capaciteitsuitbreiding	2027



Realisatie eerste periode IHP

2020-2024

Binnensport-
accommodaties



Lopende projecten binnensportaccommodaties

Locatie	Voorziening	Planning geactualiseerd
Sportzaal Belfort	Nieuwbouw	Medio 2026
Gymzaal Wittevrouwenveld	Nieuwbouw	Medio 2026
Gymzaal De Heeg	Nieuwbouw	Medio 2026
Gymzaal Scharn I	Nieuwbouw (huidig besluit) Vernieuwbouw (actualisatie)	Medio 2027



Uitvoeringsagenda
Tweede termijn IHP
2025 tot en met 2028
Binnensportaccommodaties



Overzicht voorzieningen tweede periode IHP 2025 tot met 2028 Sportaccommodaties

Locatie	Voorziening	Start voorbereidingen
Gymzaal Heer 2 (Vlinderboom)	Nieuwbouw	2026
Gymzaal Franciscus Romanusweg	Capaciteitsuitbreiding	2026
Gymzaal Sint Pieter	Levensduur verlengende renovatie	2025
Gymzaal Wolder	Nieuwbouw	2025



Start stadsronde

